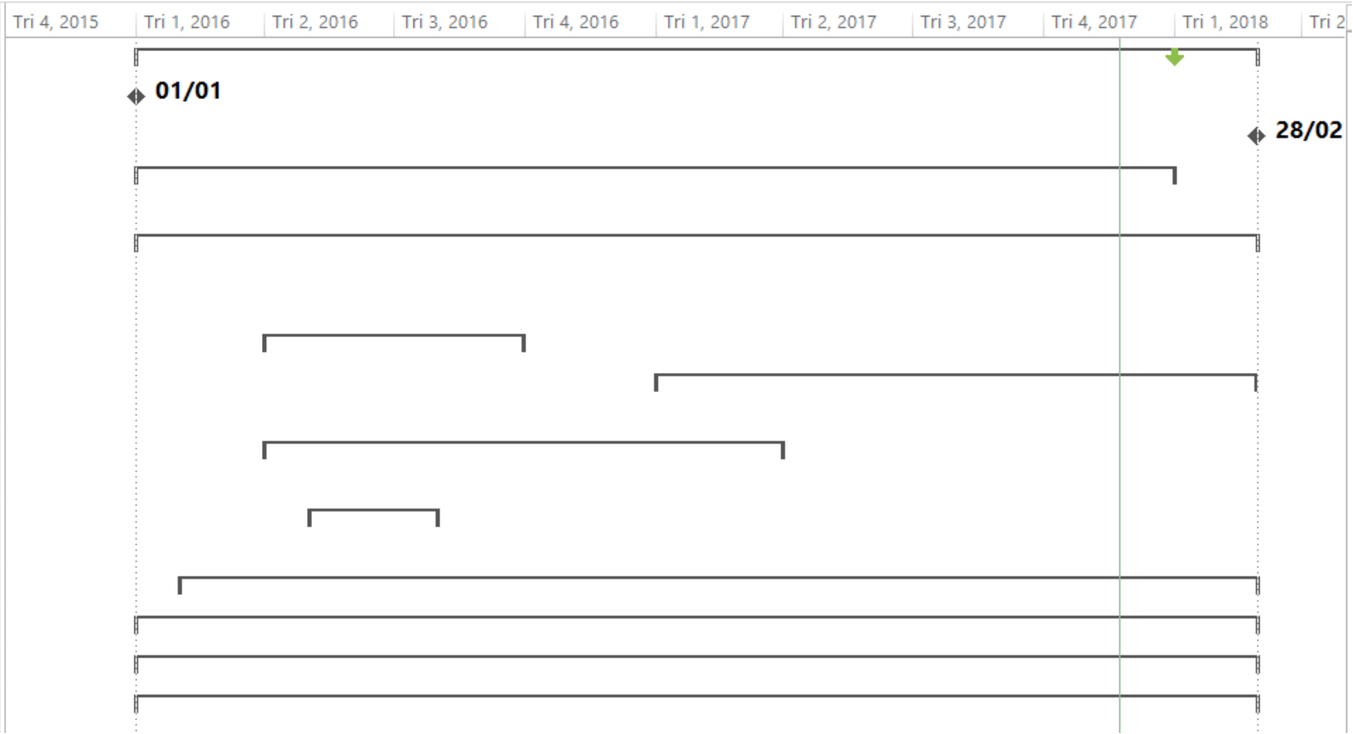WBS	Nome attività	Inizio	Fine	Durata
1	**PROGETTO OPEN MAPS**	**ven 01/01/16**	**mer 28/02/18**	**571 g**
1.1	Inizio progetto	ven 01/01/16	ven 01/01/16	0 g
1.2	Fine progetto	mer 28/02/18	mer 28/02/18	0 g
1.3	**Attività 1 - Incremento del 20% degli open data data cartografici**	**ven 01/01/16**	**dom 31/12/17**	**528 g**
1.4	**Attività - 2 Sviluppo di processi standardizzati per l'aggiornamento dei livelli informativi cartografici in collaborazione con OpenStreetMap**	**ven 01/01/16**	**mer 28/02/18**	**571 g**
1.5	**Attività 3 - Organizzazione di un evento Open Data**	**ven 01/04/16**	**ven 30/09/16**	**133 g**
1.6	**Attività 4 - Progettazione trasformazione dei dati e servizi Web cartografici regionali in Linked Open Data**	**dom 01/01/17**	**mar 27/02/18**	**306 g**
1.7	**Attività 5 - Realizzazione di tutorial sull'utilizzo dei dati e servizi cartografici**	**ven 01/04/16**	**ven 31/03/17**	**265 g**
1.8	**Attività 6 - Manutenzione evolutiva della procedura di download cartografia**	**lun 02/05/16**	**dom 31/07/16**	**66 g**
1.9	**Attivita 7 -Realizzazione Geoportale**	**lun 01/02/16**	**mer 28/02/18**	**550 g**
1.10	**Attività 8 - Comunicazione**	**ven 01/01/16**	**mer 28/02/18**	**571 g**
1.11	**Attività 9 - Governance**	**ven 01/01/16**	**mer 28/02/18**	**571 g**
1.12	**Altri costi del Progetto**	**ven 01/01/16**	**mer 28/02/18**	**571 g**
